



COMUNE DI BARDONECCHIA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO PALAZZETTO DELLO SPORT – LOTTO N. 1

INTERVENTO INDIPENDENTE DA ALTRI LOTTI FUNZIONALI

Interventi parzialmente finanziati dalla Regione Piemonte nell'ambito del Piano Operativo Regionale P.O.R. 2007-2013 "Competitività regionale ed occupazione" a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale F.E.S.R. - Asse II "Sostenibilità" - Attività II.1.3 "Efficienza energetica"

ITALIA	REGIONE PIEMONTE	PROVINCIA DI TORINO	COMUNE DI BARDONECCHIA
--------	------------------	---------------------	------------------------

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO DELL'ELABORATO

CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

CODICE GENERALE ELABORATO

COMMESSA	CODICE OPERA	AREA PROGETTAZIONE	LIVELLO PROGETTO	N° ELABORATO	VERSIONE
B453-11	REPSB	RG	E	1.7	0

IDENTIFICAZIONE FILE: B453-11_REPSB_RG_E_1.7_0.doc

Versione	Data	Disegnato	Approvato	Oggetto
0	10/2013	AB	AB	Prima emissione
1				
2				
3				

RESPONSABILE DI PROGETTO



- dott. ing. Francesco BELMONDO

PROGETTISTI



- dott. ing. Alberto BETTINI
- dott. ing. Francesco BELMONDO

TIMBRI – FIRME



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. ing. Luca NERVO


FIRMA



BBE S.r.l. - Via Brunetta, 12 – 10059 SUSA (TO)
Tel. 0122/32897 – Fax 0122/623243
e-mail info@bbesrl.it
P.IVA 08807870012

Questo elaborato è di proprietà del Comune di Bardonecchia, Piazza De Gasperi, 1 – 10052 BARDONECCHIA (TO)
Qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata

N. ord.	Cod.	Attività	Durata gg.
1	A	Allestimento cantiere, montaggio ponteggio, posa di linee vita e montaggio parapetto	2
2	B	Demolizione copertura per apertura botole uscite di sicurezza	15
3	C	Demolizione cordolo perimetrale per apertura botole per uscita sicurezza	6
4	D	Scavo per nuova cordolatura uscite di sicurezza	4
5	E	Realizzazione di bussole per uscite di sicurezza	20
6	F	Posa di serramenti per uscite di sicurezza	4
7	G	Demolizione rivestimento copertura	5
8	H	Realizzazione copertura	20
9	I	Demolizione bussola ingresso e facciate	15
10	L	Rimozione di infissi zona bar e spogliatoi	4
11	M	Realizzazione facciate continue in alluminio e vetro	20
12	N	Realizzazione di tramezzo per per ampliamento locali tecnici	6
13	O	Realizzazione delle coibentazioni	20
14	P	Posa di serramenti zona bar e spogliatoi	5
15	Q	Realizzazione facciate struttura in legno	20

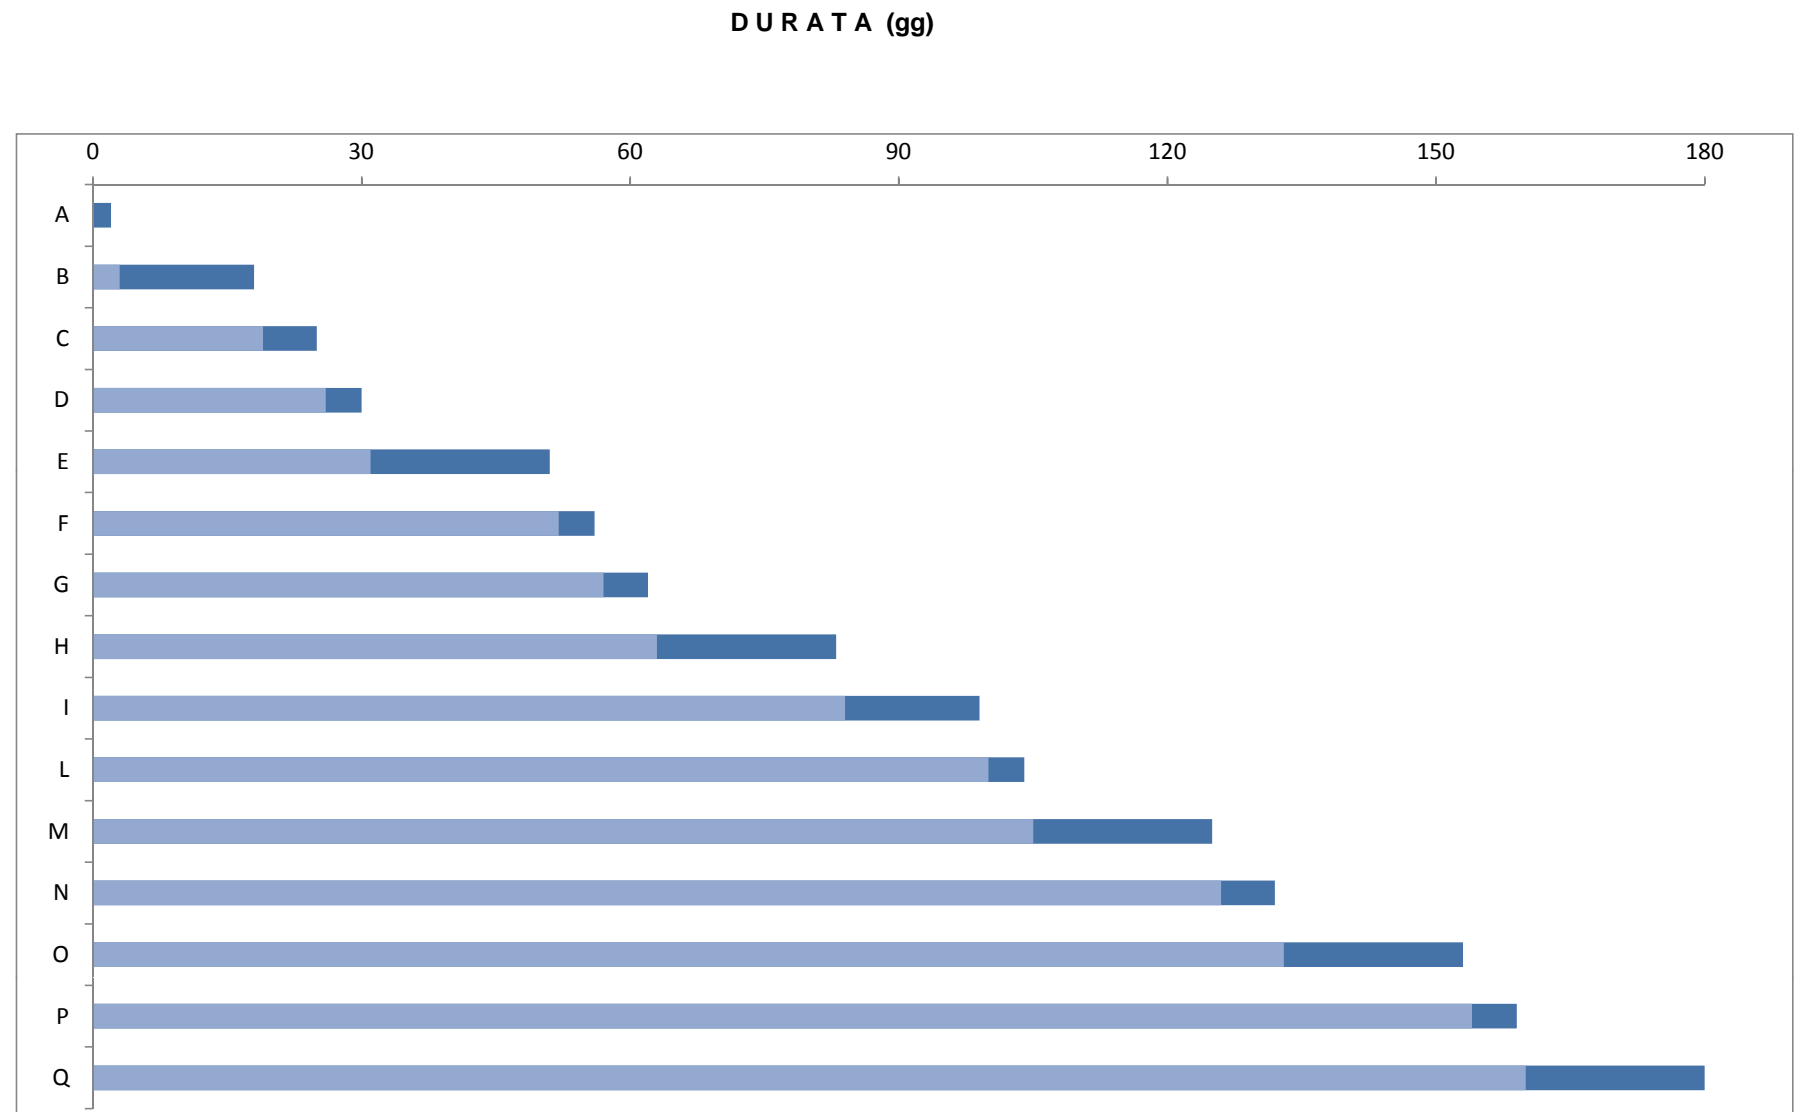

Inizio dei lavori
0 gg

Fine lavori
180 gg

TC

180
naturali consecutivi
